Id	Código INDRA	Nombre de tarea	Duración	Fecha relativa (en días)	Nombres de los recursos
1	0973525010000.0(	Cabina en Bahia (COCKPIT)	0 días	T0+61	
2		Power Rack en Bahia	0 días	T0+61	
3		Comienzo pruebas HW en cabina	0 días	T0+84	
4		Motion + Puente ready	0 días	T0+99	
5		Pruebas RTIO	0 días	T0+107	
6		**Fabricacción**	**86,88 días**		
7	**0973525300000.0(**	**BASEFRAME**	**41,5 días**		
8	0973525300100.0(	MIPPDP	100 horas	T0+0	Montador 1
9	0972828220000	SMOKE DETEC AND TEMP SENSOR ASSY	4 horas	T0+54	Montador 3
10	0973523305100.0(	VACCUM CONTROLLER BOX	32 horas	T0+51	Montador 1
11	**0973525190000.0(**	**ELECTRONIC EQUIP #1**	**32,75 días**		
12	0915437020000	VDIM CARD 400HZ 5VAC EQUIPADA	0 días	T0+0	
13	0973530110000	PANEL CARD 1	8 horas	T0+0	Montador 2
14	0973530111000	PANEL CARD 2	8 horas	T0+1	Montador 2
15	0973530114000	PANEL CARD 4	8 horas	T0+2	Montador 2
16	0973530112000	PANEL CARD 3	8 horas	T0+5	Montador 2
17	0973525191400.0(	PD#1	140 horas	T0+6	Montador 2
18	0973525190300.0(	OVHDP	140 horas	T0+0	Montador 3
19	0973525191500.0(	PD#2	140 horas	T0+16	Montador 1
20	0973525190100.0(	RTIO ASSY	120 horas	T0+23	Montador 3
21	0973525190600.0(	RTIO COM ASSY	2 horas	T0+44	Montador 3
22	**0973525200000.0(**	**ELECTRONIC EQUIP #2**	**17,5 días**		
23	0973525201000.0(	PD#3	140 horas	T0+29	Montador 2
24	0973525201600	PDAV#1	60 horas	T0+42	Montador 1
25	0972825201800.0(	AVICOM	8 horas	T0+44	Montador 3
26	0972825203200.0(	NUC TRAY ASSY	8 horas	T0+47	Montador 3
27	0972825203400.0(	MINIPC ASSY	4 horas	T0+48	Montador 3
28	**0973525210000.0(**	**ELECTRONIC EQUIP #3**	**1,25 días**		
29	0972823216000.0(	ACTUATORS TRAY ASS	8 horas	T0+49	Montador 3
30	0972823217000.0(	RELAYS TRAY ASSY	2 horas	T0+50	Montador 3
31	**0973525220000.0(**	**ELECTRONIC EQUIP #4**	**3 días**		
32	0973525220400.0(	Servo Aplifiers Unit #1	10 horas	T0+50	Montador 3
33	0973525224000.0(	EEQ4 DIST BOX	10 horas	T0+51	Montador 3
34	**0973524430000**	**CABLE SET POWER RACI**	**14 días**		
35	0973545050200	W502	4 horas	T0+0	Montador 4
36	0973545050300	W503	4 horas	T0+0	Montador 4
37	0973545050400	W504	4 horas	T0+1	Montador 4
38	0973545050500	W505	4 horas	T0+1	Montador 4
39	0973545050600	W506	4 horas	T0+2	Montador 4
40	0973545050700	W507	4 horas	T0+2	Montador 4
41	0973545050800	W508	4 horas	T0+5	Montador 4
42	0973545050900	W509	4 horas	T0+5	Montador 4
43	0973545051100	W511	4 horas	T0+6	Montador 4
44	0973545051200	W512	4 horas	T0+6	Montador 4
45	0973545051300	W513	4 horas	T0+7	Montador 4
46	0973545051400	W514	4 horas	T0+7	Montador 4
47	0973545051500	W515	4 horas	T0+8	Montador 4
48	0973545051600	W516	4 horas	T0+8	Montador 4
49	0973545051700	W517	4 horas	T0+9	Montador 4

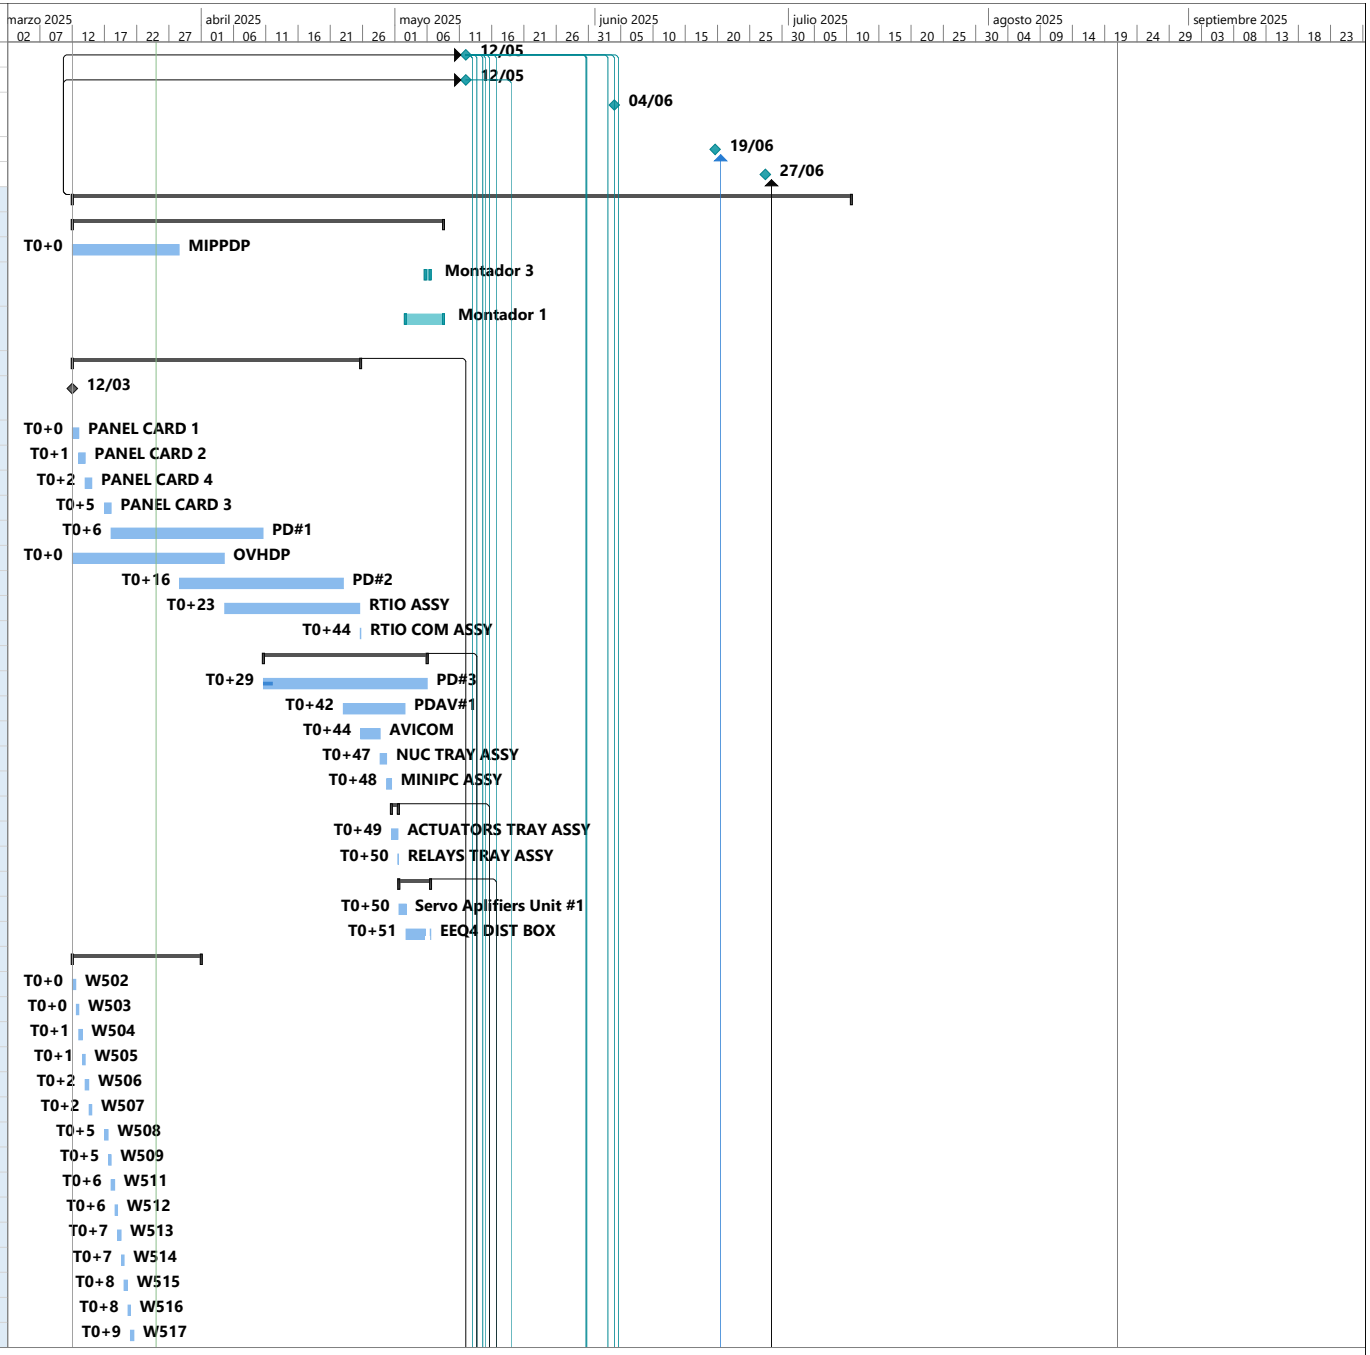

Id	Código INDRA	Nombre de tarea	Duración	Fecha relativa (en días)	Nombres de los recursos
50	0973545051800	W518	4 horas	T0+9	Montador 4
51	0973545051900	W519	4 horas	T0+12	Montador 4
52	0973545052200	W522	4 horas	T0+12	Montador 4
53	0973545052300	W523	4 horas	T0+13	Montador 4
54	0973545052400	W524	4 horas	T0+13	Montador 4
55	0973545052600	W526	4 horas	T0+14	Montador 4
56	0973545052700	W527	4 horas	T0+14	Montador 4
57	0973545052800	W528	4 horas	T0+15	Montador 4
58	0973545053800	W538	4 horas	T0+15	Montador 4
59	0973545054100	W541	4 horas	T0+16	Montador 4
60	0973545054200	W542	4 horas	T0+16	Montador 4
61	0973545054300	W543	4 horas	T0+19	Montador 4
62	0973545054400	W544	4 horas	T0+19	Montador 4
63	**0973524190000**	**CABLE SET EEQ#1**	**2,5 días**		
64	0973544190100	PWR OVHDP	4 horas	T0+20	Montador 4
65	0973544190200	PWR RTIO ASSY	4 horas	T0+20	Montador 4
66	0973544190300	PWR PD#1	4 horas	T0+21	Montador 4
67	0973544190400	PWR PD#2	4 horas	T0+21	Montador 4
68	0973544190500	PWR MIPPDP	4 horas	T0+22	Montador 4
69	**0973524200000**	**CABLE SET EEQ#2**	**3 días**		
70	0973544200100	PWR PD#3	4 horas	T0+22	Montador 4
71	0973544200200	PWR IOS#1	4 horas	T0+23	Montador 4
72	0972844204506	A0202W06	4 horas	T0+23	Montador 4
73	0973544201200	PWR IOS#2 TFT1	4 horas	T0+26	Montador 4
74	0973544201300	A0202W13	4 horas	T0+26	Montador 4
75	0973544201400	A0202W14	4 horas	T0+27	Montador 4
76	**0973524191400**	**CABLE SET PD#1**	**12,5 días**		
77	0973545000200	W002 - CABLE PD/CABINA	20 horas	T0+27	Montador 4
78	0973545000400	W004 - CABLE PD/CABINA	20 horas	T0+30	Montador 4
79	0973545000500	W005 - CABLE PD/CABINA	20 horas	T0+34	Montador 4
80	0973545000600	W006 - CABLE PD/CABINA	20 horas	T0+37	Montador 4
81	0973545000700	W007 - CABLE PD/CABINA	20 horas	T0+41	Montador 4
82	**0973524191500**	**CABLE SET PD#2**	**10 días**		
83	0973545001000	W010 - CABLE PD/CABINA	20 horas	T0+44	Montador 4
84	0973545001200	W012 - CABLE PD/CABINA	20 horas	T0+48	Montador 4
85	0973545001300	W013 - CABLE PD/CABINA	20 horas	T0+51	Montador 4
86	0973545001400	W014 - CABLE PD/CABINA	20 horas	T0+55	Montador 4
87	**0973524190300**	**CABLE SET OVHDP**	**15 días**		
88	0973545002300	W022 - CABLE PD/CABINA	20 horas	T0+55	Montador 2
89	0973545002200	W023 - CABLE PD/CABINA	20 horas	T0+57	Montador 2
90	0973545002400	W024 - CABLE PD/CABINA	20 horas	T0+62	Montador 2
91	0973545002500	W025 - CABLE PD/CABINA	20 horas	T0+64	Montador 2

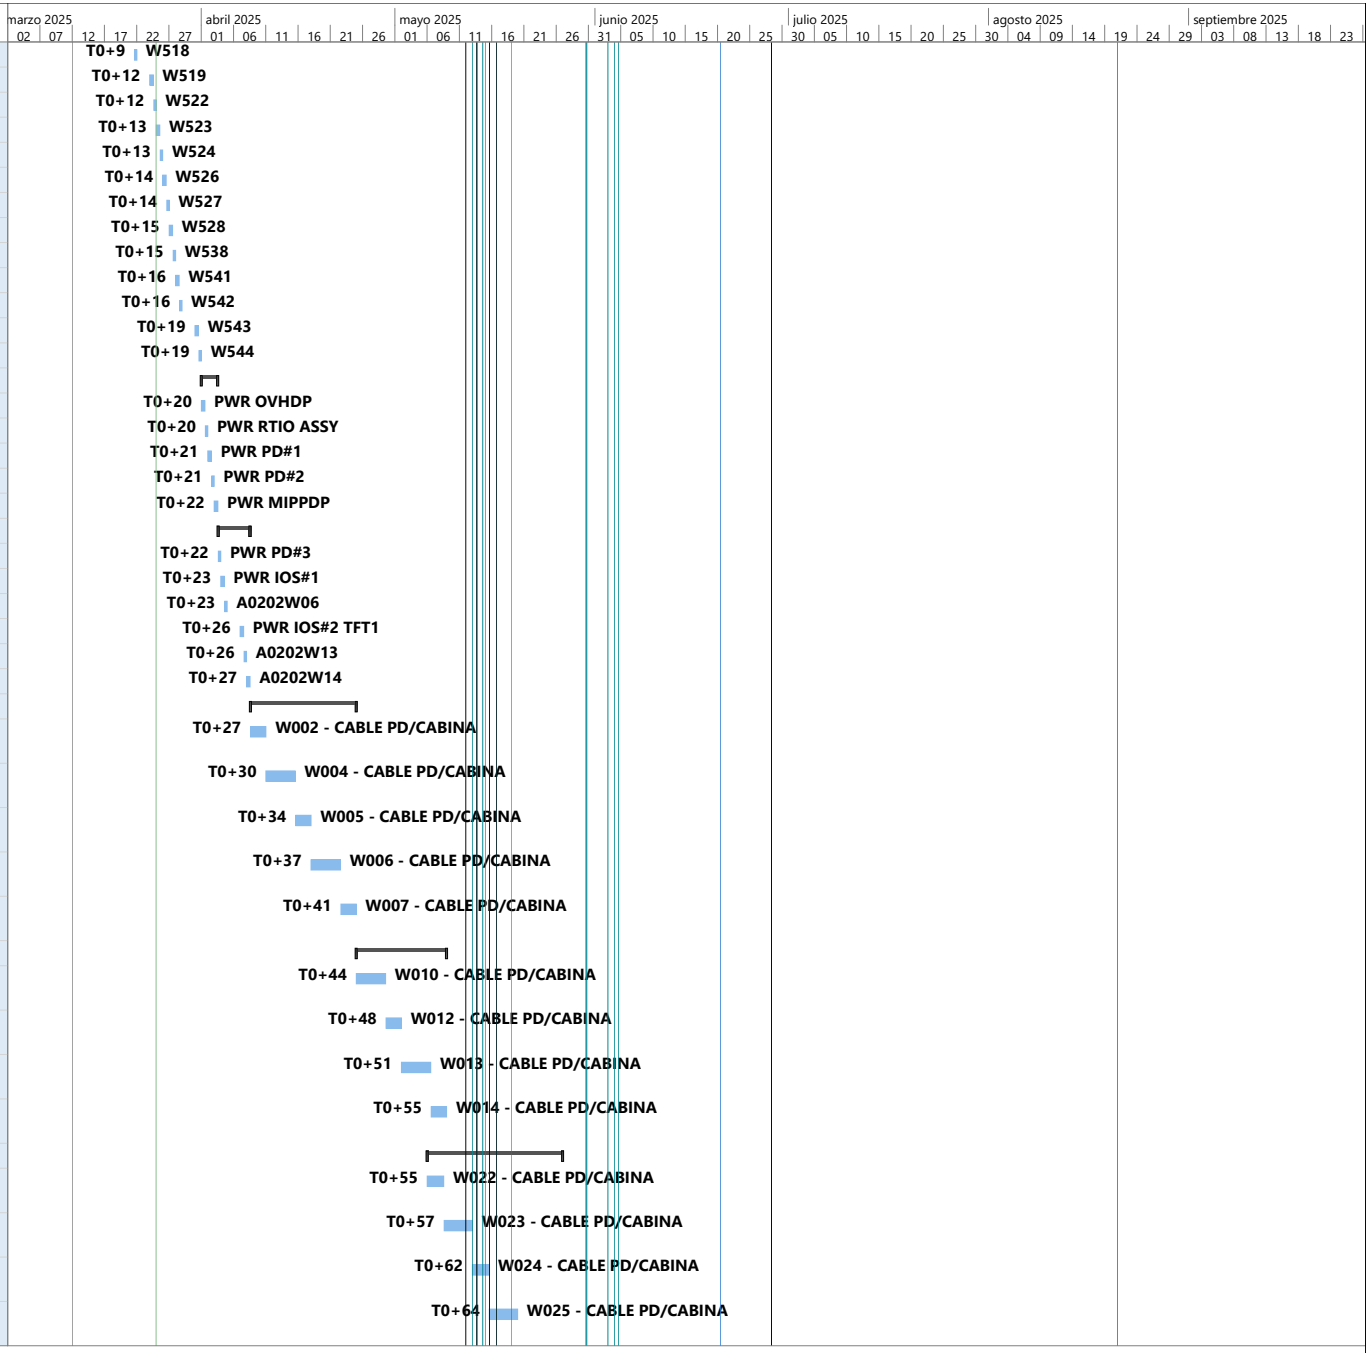

Id	Código INDRA	Nombre de tarea	Duración	Fecha relativa (en días)	Nombres de los recursos
92	0973545002600	W026 - CABLE PD/CABINA	20 horas	T0+69	Montador 2
93	0973545003000	W030 - CABLE PD/CABINA	20 horas	T0+71	Montador 2
94	**0973524190100**	**CABLE SET POWER EEQ#**	**1,38 días**		
95	0973545042100	W421 - FC	3 horas	T0+57	Montador 1
96	0972845042300	W423 - TRANSPORT DELAY	3 horas	T0+57	Montador 1
97	0972845042400	W424 - DISPLAY PHD	2 horas	T0+58	Montador 1
98	0972845042500	W425 - DU PHD	3 horas	T0+58	Montador 1
99	**0973524300100**	**CABLE SET MIP**	**18 días**		
100	0973545003600	W036 - CABLE PD/CABINA	18 horas	T0+58	Montador 1
101	0973545003700	W037 - CABLE PD/CABINA	18 horas	T0+63	Montador 1
102	0973545003800	W038 - CABLE PD/CABINA	18 horas	T0+65	Montador 1
103	0973545003900	W039 - CABLE PD/CABINA	18 horas	T0+69	Montador 1
104	0973545004000	W040 - CABLE PD/CABINA	18 horas	T0+71	Montador 1
105	0973545004100	W041 - CABLE PD/CABINA	18 horas	T0+76	Montador 1
106	0973545004200	W042 - CABLE PD/CABINA	18 horas	T0+78	Montador 1
107	0973545004400	W044 - CABLE PD/CABINA	18 horas	T0+82	Montador 1
108	**0973524300000**	**CABLE SET BASEFRAME**	**2,75 días**		
109	0973544300100	PWR IOS CONSOLE#1 TFT1	3 horas	T0+58	Montador 4
110	0973544300200	PWR IOS CONSOLE#1 TFT2	3 horas	T0+58	Montador 4
111	0973544300300	USB IOS CONSOLE#1 EXT TFT1	2 horas	T0+58	Montador 4
112	0973544300300	USB IOS CONSOLE#1 EXT TFT1	2 horas	T0+61	Montador 4
113	0973544300400	USB IOS CONSOLE#1 EXT TFT2	2 horas	T0+61	Montador 4
114	0973544300400	USB IOS CONSOLE#1 EXT TFT2	2 horas	T0+61	Montador 4
115	0973544300500	A04W20	4 horas	T0+61	Montador 4
116	0973544300600	A04W21	4 horas	T0+62	Montador 4
117	**0973524020000**	**CABLE SET CAN**	**9,63 días**		
118	0973545020201	W901 - CAN1 A	2 horas	T0+55	Montador 3
119	0973545020202	W902 - CAN2 A	2 horas	T0+55	Montador 3
120	0973545020103	W903 - CAN3 A	2 horas	T0+56	Montador 3
121	0973545020104	W904 - CAN4 A	2 horas	T0+56	Montador 3
122	0973545020105	W905 - CAN5 A	2 horas	T0+56	Montador 3
123	0973545020206	W906 - CAN6 A	2 horas	T0+56	Montador 3
124	0973545020107	W907 - CAN7 A	2 horas	T0+57	Montador 3
125	0973545020208	W908 - CAN8 A	2 horas	T0+57	Montador 3
126	0973545020209	W909 - CAN9 A	2 horas	T0+57	Montador 3
127	0973545020300	W910 - CAN10 A	2 horas	T0+57	Montador 3
128	0973545020413	W913 - CAN3 B	2 horas	T0+58	Montador 3
129	0973545020414	W914 - CAN4 B	2 horas	T0+58	Montador 3
130	0973545020415	W915 - CAN5 B	2 horas	T0+58	Montador 3

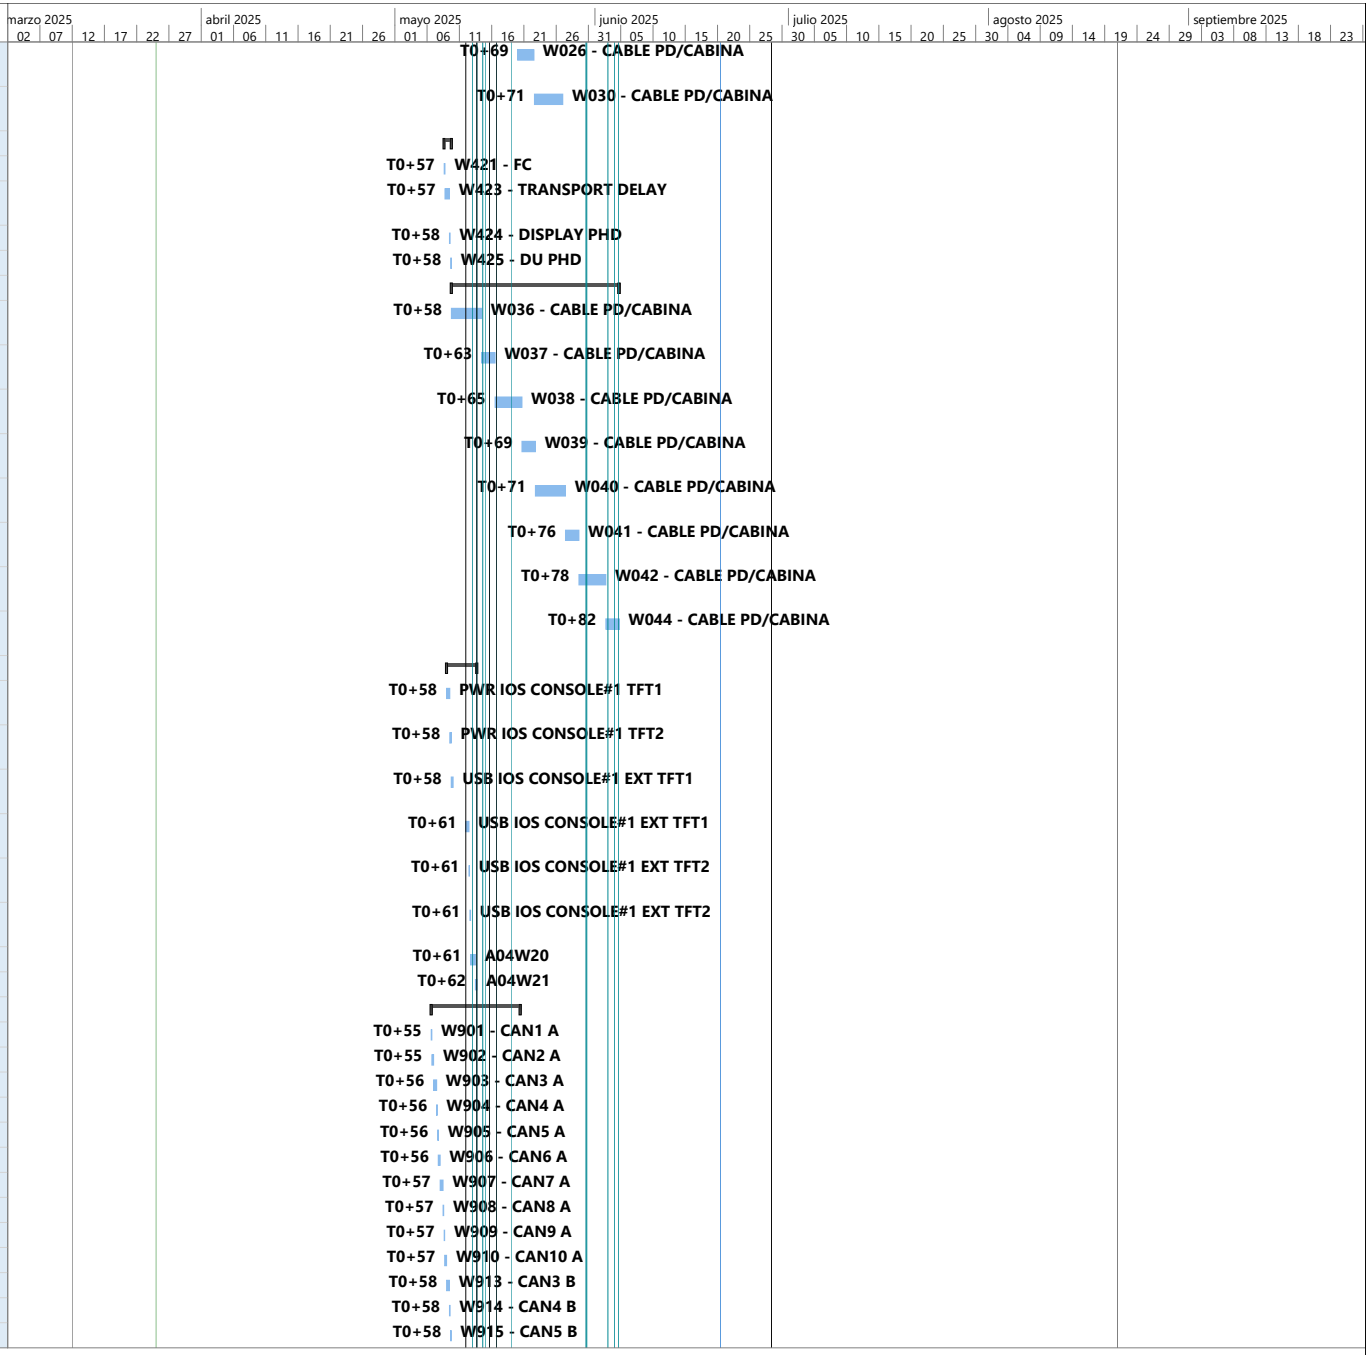

Id	Código INDRA	Nombre de tarea	Duración	Fecha relativa (en días)	Nombres de los recursos
131	0973545020417	W917 - CAN7 B	2 horas	T0+58	Montador 3
132	0973545020118	W918 - CAN8 B	2 horas	T0+61	Montador 3
133	0973545020520	W920 - CAN10 B	2 horas	T0+61	Montador 3
134	0973545020423	W923 - CAN3 C	2 horas	T0+61	Montador 3
135	0973545020424	W924 - CAN4 C	2 horas	T0+61	Montador 3
136	0973545020425	W925 - CAN5 C	2 horas	T0+62	Montador 3
137	0973545020427	W927 - CAN7 C	2 horas	T0+62	Montador 3
138	0973545092900	W929 - CAN9 C	2 horas	T0+62	Montador 3
139	0973545020530	W930 - CAN10 C	2 horas	T0+62	Montador 3
140	0973545020433	W933 - CAN3 D	2 horas	T0+63	Montador 3
141	0973545020434	W934 - CAN4 D	2 horas	T0+63	Montador 3
142	0973545020435	W935 - CAN5 D	2 horas	T0+63	Montador 3
143	0973545020437	W937 - CAN7 D	2 horas	T0+63	Montador 3
144	0973545020540	W940 - CAN10 D	2 horas	T0+64	Montador 3
145	0973545020445	W945 - CAN5 E	2 horas	T0+64	Montador 3
146	0973545020447	W947 - CAN7 E	2 horas	T0+64	Montador 3
147	0973545020455	W955 - CAN5 F	2 horas	T0+64	Montador 3
148	0973545020457	W957 - CAN7 F	2 horas	T0+65	Montador 3
149	0973545020467	W967 - CAN7 G	2 horas	T0+65	Montador 3
150	0973545020477	W977 - CAN7 H	2 horas	T0+65	Montador 3
151	0973545020881	W981 - CAN1 T	2 horas	T0+65	Montador 3
152	0973545020882	W982 - CAN2 T	2 horas	T0+68	Montador 3
153	0973545020683	W983 - CAN3 T	1 hora	T0+68	Montador 3
154	0973545020684	W984 - CAN4 T	1 hora	T0+68	Montador 3
155	0973545020685	W985 - CAN5 T	1 hora	T0+68	Montador 3
156	0973545020886	W986 - CAN6 T	1 hora	T0+68	Montador 3
157	0973545020687	W987 - CAN7 T	1 hora	T0+68	Montador 3
158	0973545020688	W988 - CAN8 T	1 hora	T0+68	Montador 3
159	0973545020700	W990 - CAN10 T	1 hora	T0+69	Montador 3
160	**973524201800**	**CABLE SET AVICOM**	**1,5 días**		
161	0972845008001	W081 - CABLE TAv/Av	4 horas	T0+62	Montador 4
162	0972845008002	W082 - CABLE TAv/Av	4 horas	T0+63	Montador 4
163	0972845008003	W083 - CABLE TAv/Av	4 horas	T0+63	Montador 4
164	**0973524201600**	**CABLE SET AVDP**	**3,75 días**		
165	0973545009100	W091 - CABLE AvDP/P	10 horas	T0+64	Montador 4
166	973545009200	W092 - CABLE AvDP/P	10 horas	T0+65	Montador 4
167	0973545009300	W093 - CABLE AvDP/P	10 horas	T0+68	Montador 4
168	**0973524070100**	**CABLE SET VIDEO DISPLAY UNITS**	**2,15 días**		
169	0973544080001	W801 - VIDEO DU FO OUTB	0,2 horas	T0+69	Montador 3
170	0973544080002	W802 - VIDEO DU FO INBD	0,2 horas	T0+69	Montador 3
171	0973544080003	W803 - VIDEO UPPER CENTER	0,2 horas	T0+69	Montador 3
172	0973544080004	W804 - VIDEO LOWER CENTER	0,2 horas	T0+69	Montador 3
173	0973544080005	W805 - VIDEO DU CAPT OUTB	0,2 horas	T0+71	Montador 3
174	0973544080006	W806 - VIDEO DU CAPT INBD	0,2 horas	T0+69	Montador 3
175	0973544080007	W807 - VIDEO MCDU1	0,2 horas	T0+69	Montador 3
176	0973544080008	W808 - VIDEO MCDU2	0,2 horas	T0+69	Montador 3

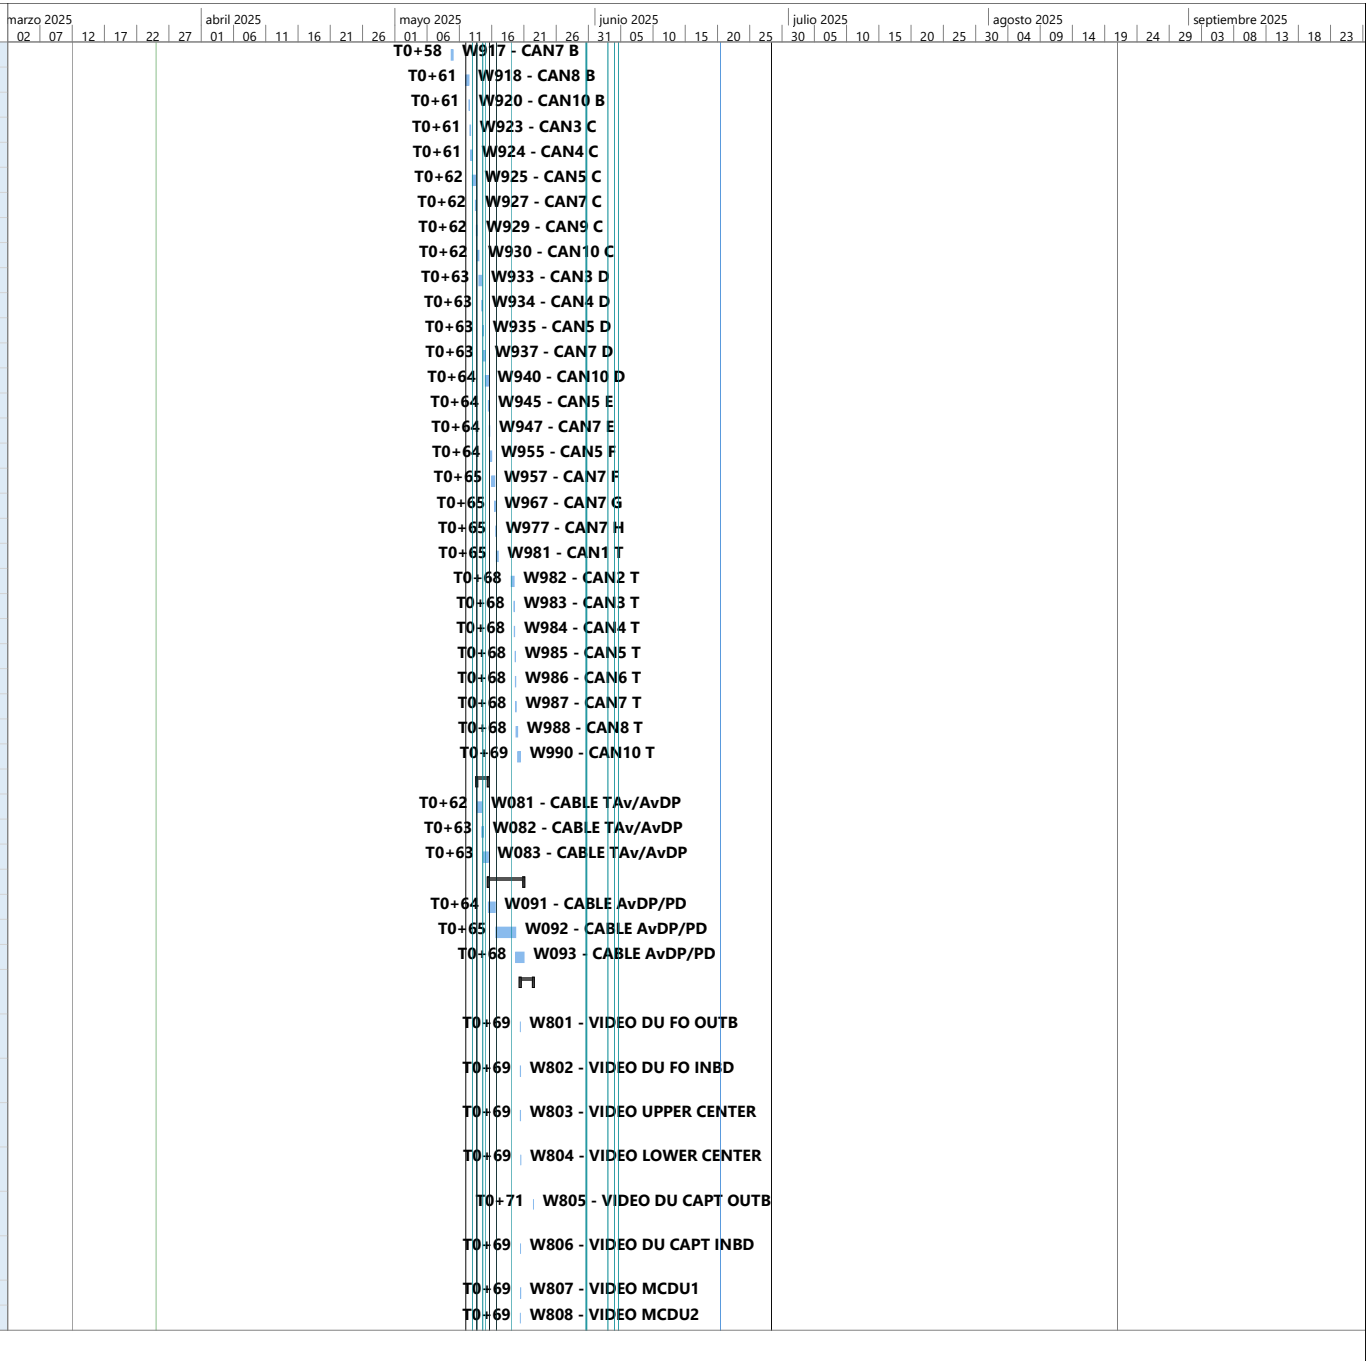

Id	Código INDRA	Nombre de tarea	Duración	Fecha relativa (en días)	Nombres de los recursos
177	**0973524070200**	**CABLE SET ETH DISPLAY UNITS**	**2 días**		
178	0973545081001	W811 - LAN DU CAPT OUTBD	0,2 horas	T0+69	Montador 3
179	0973545081002	W812 - LAN DU CAPT INBD	0,2 horas	T0+69	Montador 3
180	0973545081003	W813 - LAN DU UPPER CENTER	0,2 horas	T0+69	Montador 3
181	0973545081004	W814 - LAN DU LOWER CENTER	0,2 horas	T0+69	Montador 3
182	0973545081005	W815 - LAN DU FO OUTBD	0,2 horas	T0+71	Montador 3
183	0973545081006	W816 - LAN DU FO INI	0,2 horas	T0+71	Montador 3
184	0973545081007	W817 - LAN MCDU1	0,2 horas	T0+71	Montador 3
185	0973545081008	W818 - LAN MCDU2	0,2 horas	T0+71	Montador 3
186	**0973524070300**	**CABLE SET PWR DISPLAY UNITS**	**8,35 días**		
187	0973545082001	W821 - PWR DU CAPT OUTBD	2 horas	T0+70	Montador 3
188	0973545082002	W822 - PWR DU CAPT INBD	2 horas	T0+70	Montador 3
189	0973545082003	W823 - PWR DU UPPER CENTER	2 horas	T0+75	Montador 3
190	0973545082004	W824 - PWR DU LOWER CENTER	2 horas	T0+70	Montador 3
191	0973545082005	W825 - PWR DU FO OUTBD	2 horas	T0+69	Montador 3
192	0973545082006	W826 - PWR DU FO INBD	2 horas	T0+79	Montador 4
193	0973545082007	W827	2 horas	T0+69	Montador 3
194	0973545082008	W828 - PWR MCDU2	2 horas	T0+70	Montador 3
195	**0973524212100**	**CABLE SET COMMS DP**	**3 días**		
196	0973545040000	W400 - COMMS	8 horas	T0+70	Montador 4
197	0973545040100	W401 - COMMS	8 horas	T0+71	Montador 4
198	0973545040200	W402 - COMMS	8 horas	T0+72	Montador 4
199	**0973524210200**	**CABLE SET DACS EEQ#3**	**6 días**		
200	0973545210301	A0203W51 - BUNDLE	2 horas	T0+75	Montador 4
201	0973545210302	A0203W52 - BUNDLE	2 horas	T0+75	Montador 4
202	0973545210303	A0203W53 - BUNDLE	2 horas	T0+75	Montador 4
203	0973545210304	A0203W54 - BUNDLE	2 horas	T0+75	Montador 4
204	0973545210305	A0203W55 - BUNDLE	2 horas	T0+76	Montador 4
205	0973545210306	A0203W56 - BUNDLE	2 horas	T0+76	Montador 4
206	0973545210307	A0203W57 - BUNDLE	2 horas	T0+76	Montador 4
207	0973545210308	A0203W58 - BUNDLE	2 horas	T0+76	Montador 4
208	0973545210401	A0203W59 - BUNDLE	2 horas	T0+77	Montador 4
209	0973545210501	A0203W60 - BUNDLE	4 horas	T0+77	Montador 4
210	0973545210601	A0203W61 - BUNDLE	4 horas	T0+77	Montador 4
211	0973545210701	A0203W62 - BUNDLE	4 horas	T0+78	Montador 4
212	0973545210801	A0203W63 - BUNDLE	4 horas	T0+78	Montador 4
213	0973545210901	A0203W64 - BUNDLE	4 horas	T0+79	Montador 4
214	0973545210902	A0203W65 - BUNDLE	4 horas	T0+82	Montador 4
215	0973545210903	A0203W66 - BUNDLE	4 horas	T0+82	Montador 4
216	**0973525411000**	**CABLE SET DACS**	**7,5 días**		
217	0973545030101	W301 - BUNDLE	4 horas	T0+72	Montador 3
218	0973545030201	W302 - BUNDLE	4 horas	T0+72	Montador 3

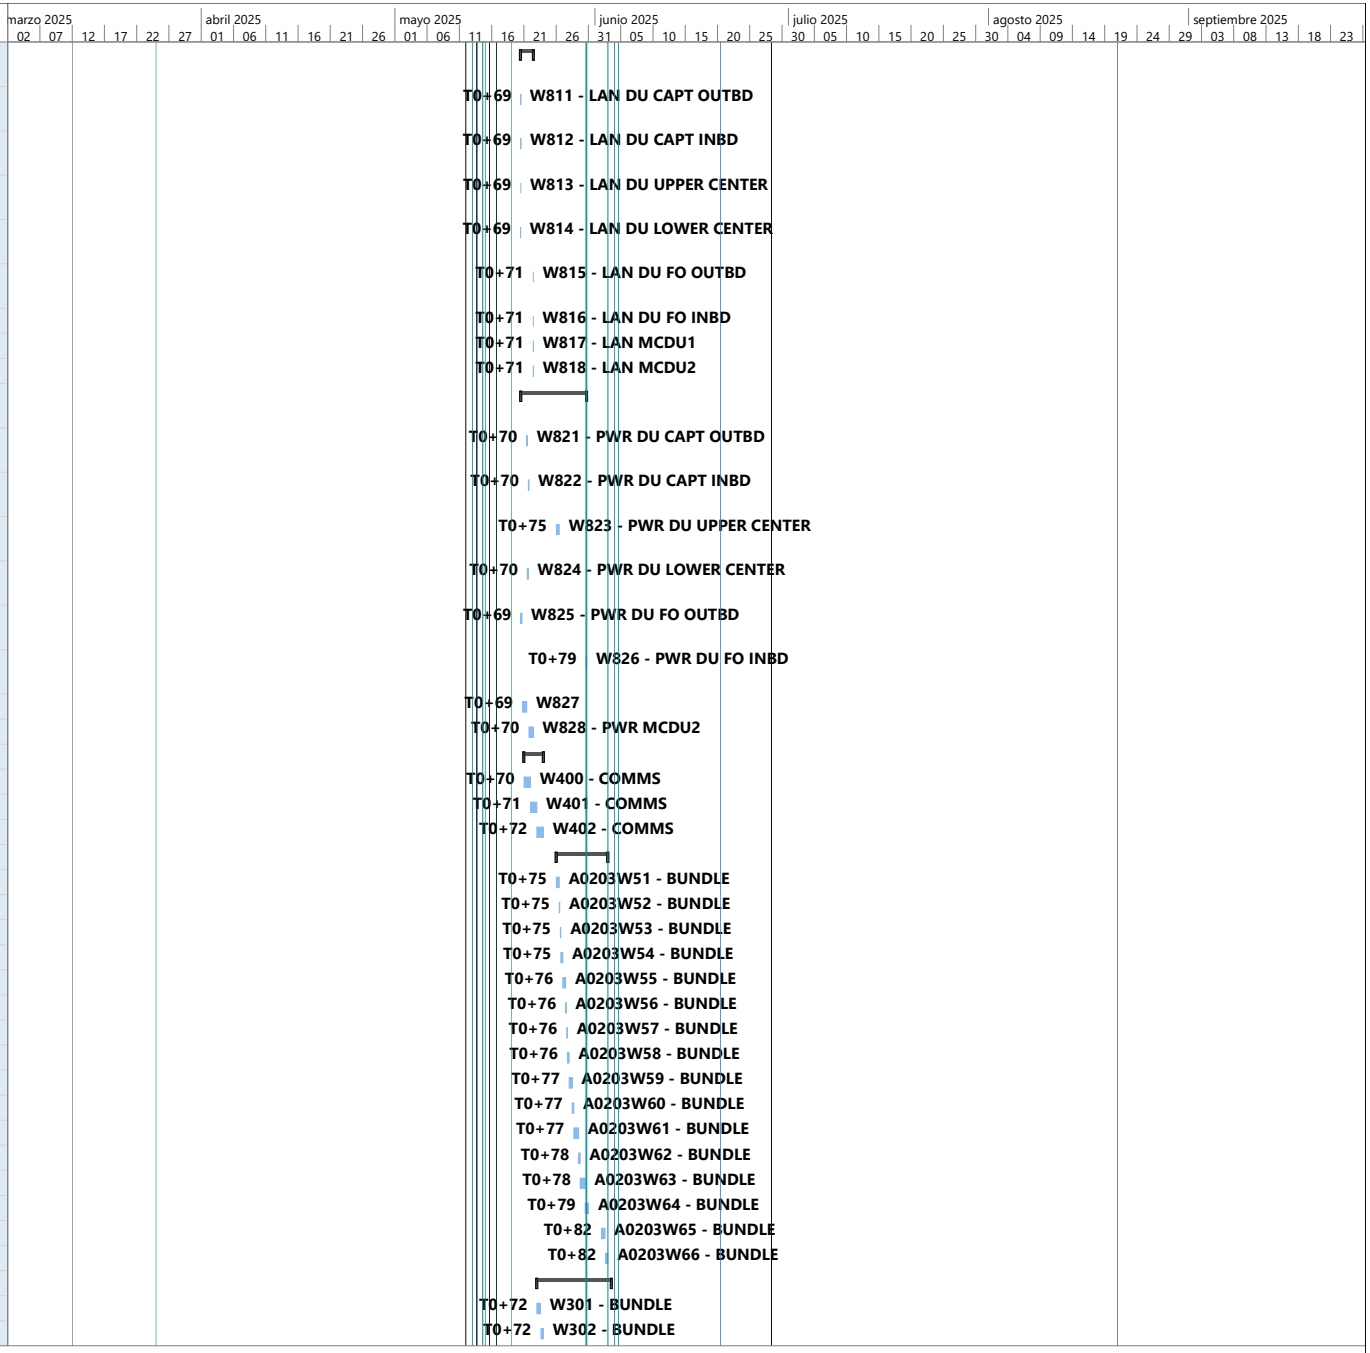

Id	Código INDRA	Nombre de tarea	Duración	Fecha relativa (en días)	Nombres de los recursos
219	0973545030301	W303 - BUNDLE	4 horas	T0+75	Montador 3
220	0973545030401	W304 - BUNDLE	4 horas	T0+75	Montador 3
221	0973545030402	W305 - BUNDLE	4 horas	T0+76	Montador 3
222	0973545030403	W306 - BUNDLE	4 horas	T0+76	Montador 3
223	0973545030404	W307 - BUNDLE	4 horas	T0+77	Montador 3
224	0973545030405	W308 - BUNDLE	4 horas	T0+77	Montador 3
225	0973545030406	W309 - BUNDLE	4 horas	T0+83	Montador 4
226	0973545030407	W310 - BUNDLE	4 horas	T0+78	Montador 3
227	0973545031101	W311 - BUNDLE	4 horas	T0+78	Montador 3
228	0973545031102	W312 - BUNDLE	4 horas	T0+79	Montador 3
229	**0973525310000.0(**	**DRAWBRIDGE**	**13,75 días**		
230	0973525310100.0(	Drawbridge CTRL Unit (DBCU)	100 horas	T0+76	Montador 2
231	0973525310200.0(	SMOKE CONTROL BO	1 día	T0+92	Montador 2
232	0972825311200	YELLOW EMERGENCY STOP	2 horas	T0+93	Montador 2
233		**Paneles Cabina**	**86,88 días**		
234	**0973525030000.0(**	**LEFT CONSOLE**	**2 días**		
235	0973525030500.0(	HAND MIC PANEL CAPT	8 horas	T0+0	Montador 5
236	0973525031000.0(	HEADSET PANEL FOURTH	8 horas	T0+1	Montador 5
237	**0973525060000.0(**	**RIGHT CONSOLE**	**2 días**		
238	0973525060500.0(	HAND MIC PANEL F	8 horas	T0+2	Montador 5
239	0973525060900.0(	AUDIO CONNECTION	8 horas	T0+5	Montador 5
240	**0973525070000.0(**	**MAIN INSTRUMENT PANEL**	**13,5 días**		
241	0973525070100.0(	LIGHTING/LOUDSPI CP CAPT	32 horas	T0+6	Montador 5
242	0973525070700.0(	CENTER INSTRUMENT	4 horas	T0+12	Montador 5
243	0973525072400.0(	LANDING GEAR CONTROL&INDICAT PANEL	32 horas	T0+12	Montador 5
244	0973525070800.0(	CENTER INSTRUMENT	4 horas	T0+16	Montador 5
245	0973525073300.0(	TERR ON ND PANEL	4 horas	T0+19	Montador 5
246	0973525071300.0(	LIGHTING/LOUDSPI CP F/O	32 horas	T0+19	Montador 5
247	**0973525090000.0(**	**PEDESTAL**	**15,5 días**		
248	0973525091300.0(	FLOOD LIGHT&INTEGRAL LT PANEL	8 horas	T0+23	Montador 5
249	0973525091400.0(	FLOOD LIGHT PANE	8 horas	T0+26	Montador 5
250	0973525091800.0(	COCKPIT DOOR PAN	8 horas	T0+27	Montador 5
251	0973525092100.0(	SWITCHING PANEL	32 horas	T0+28	Montador 5
252	0973525092300.0(	ENGINE PANEL	32 horas	T0+34	Montador 5
253	0973525092400.0(	RUD TRIM&PARKING	32 horas	T0+40	Montador 5
254	0971725082600	COCKPIT HANDSET ASSEMBLY	4 horas	T0+44	Montador 5
255	**0973525100000.0(**	**GLARESHIELD**	**8 días**		
256	0973525100100.0(	GLARESHIELD CAPT	32 horas	T0+47	Montador 5
257	0973525100200.0(	GLARESHIELD F/O	32 horas	T0+51	Montador 5
258	**0973525110000.0(**	**OVERHEAD PANEL**	**35,63 días**		

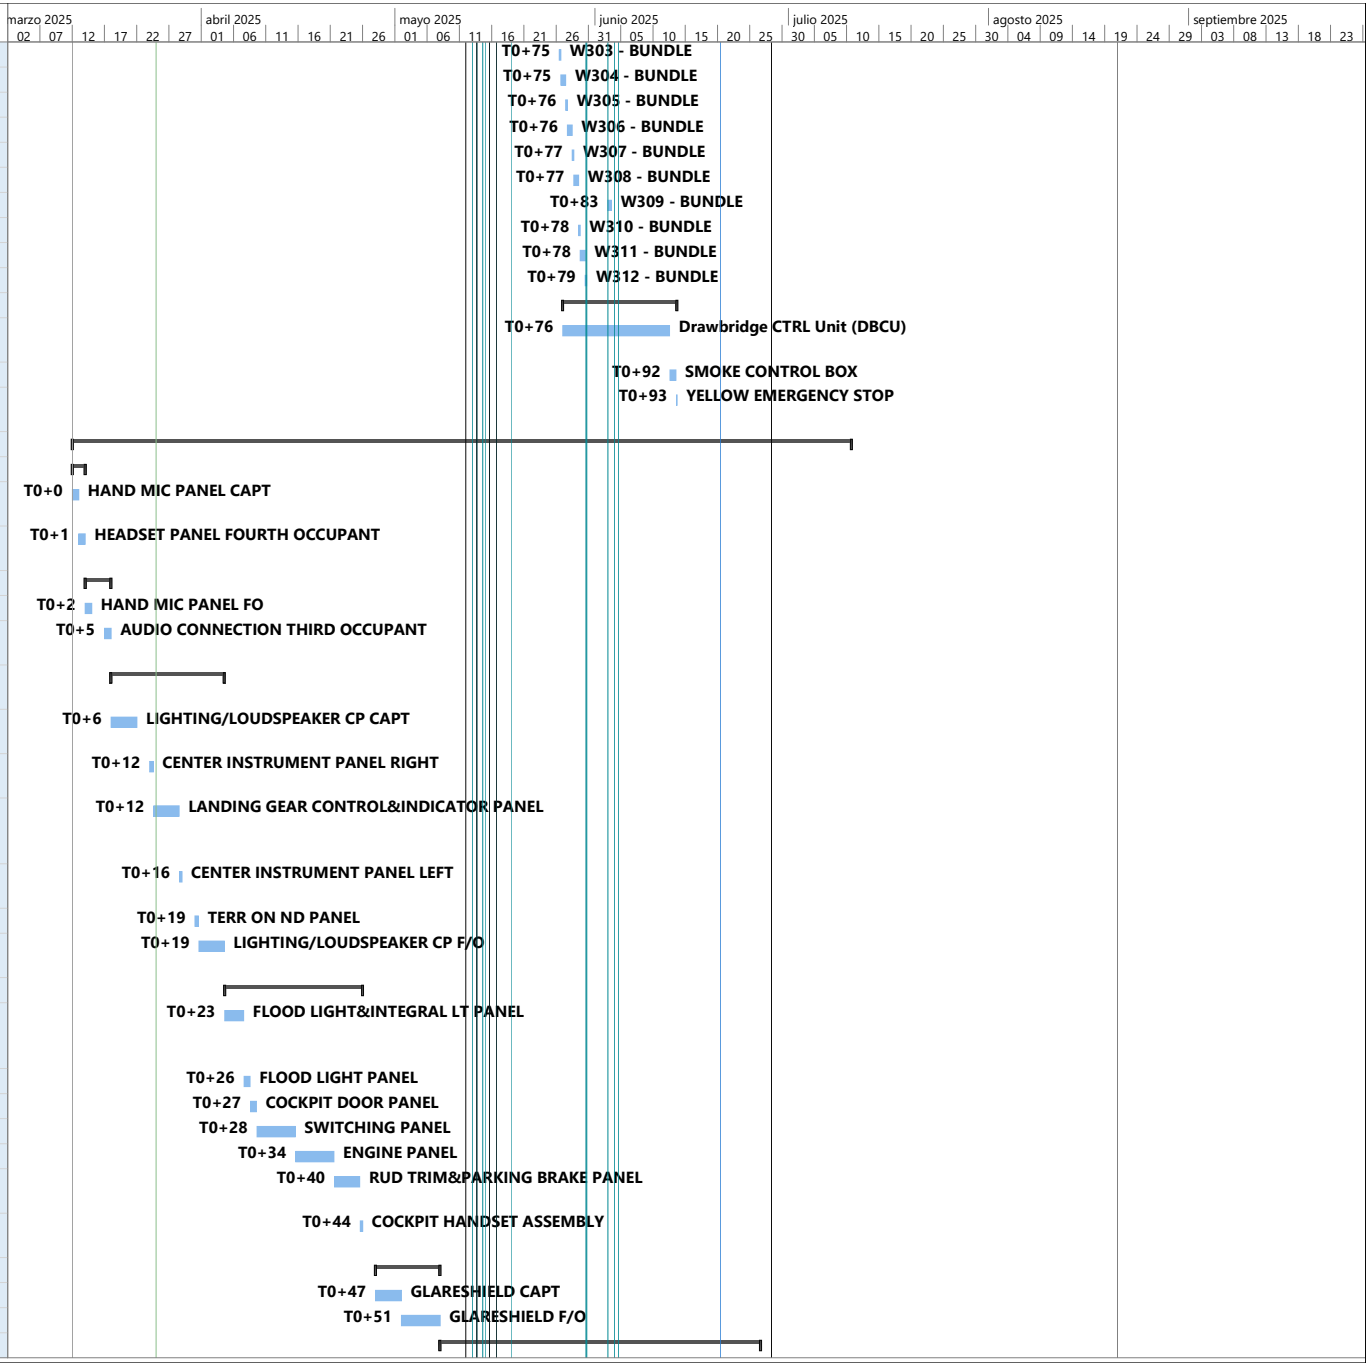

Id	Código INDRA	Nombre de tarea	Duración	Fecha relativa (en días)	Nombres de los recursos
259	0973525110100.0(	LEFT LATERAL PANE	32 horas	T0+57	Montador 5
260	0973525110200.0(	RIGHT LATERAL PAI	32 horas	T0+63	Montador 5
261	0973525110300.0(	LEFT FLIGHT CONTROL PANEL	32 horas	T0+69	Montador 5
262	0973525110400.0(	RIGHT FLIGHT CONTROL PANEL	32 horas	T0+89	Montador 4
263	0973525110500.0(	SYSTEMS PANEL	32 horas	T0+75	Montador 5
264	0973525110600.0(	PASSENGER ADRESS PANEL	8 horas	T0+79	Montador 5
265	0973525110700.0(	AIR COND PANEL	32 horas	T0+90	Montador 3
266	0973525110800.0(	ELEC PANEL	32 horas	T0+93	Montador 4
267	0973525110900.0(	HYD/FUEL PANEL	32 horas	T0+82	Montador 3
268	0973525111000.0(	CTRL AND INDICATING PANEL	8 horas	T0+82	Montador 5
269	0973525111100.0(	CIRCUIT BREAKER PANEL	60 horas	T0+83	Montador 5
270	0973525111200.0(	MAINTENANCE PAN	32 horas	T0+83	Montador 4
271	0973525111500.0(	LEFT READING LIGHT PANEL	8 horas	T0+84	Montador 1
272	0973525111600.0(	RIGHT READING LIGHT PANEL	8 horas	T0+85	Montador 1
273	0973525111700.0(	GND HF DATA LINK	8 horas	T0+93	Montador 5
274	0973525112000.0(	FIRE PANEL-ENGINE	32 horas	T0+100	Montador 5
275	0973525112300.0(	CONTROL-COCKPIT SYSTEM	8 horas	T0+89	Montador 3
276	0973525113000.0(	AUDIO CONNECTION	8 horas	T0+86	Montador 3
277	0973525113100.0(	AUDIO CONNECTION	8 horas	T0+99	Montador 4
278	0973525133000.0(	CAMERA DBS ASSY	1 hora	T0+92	Montador 5
279	0973525139000.0(	IND LIGHTED ICING	8 horas	T0+92	Montador 5
280	0973525140000.0(	ADIRS PANEL	32 horas	T0+96	Montador 5
281	**0973525135000.0(**	**C/B CABIN PANEL**	**24 días**		
282	0973525140100.0(	REAR CB PANEL#1	80 horas	T0+86	Montador 1
283	0973525140200.0(	REAR CB PANEL#2	80 horas	T0+100	Montador 1
284	0973525140300.0(	REAR CB PANEL#3	32 horas	T0+114	Montador 1
285	0973525140400.0(	REAR CB PANEL#4	8 horas	T0+107	Montador 5
286	0973525140500.0(	REAR CB PANEL#5	8 horas	T0+106	Montador 5
287	0973525140600.0(	CB DISTRIBUTION PANEL #1	40 horas	T0+93	Montador 2
288	0973525140700.0(	CB DISTRIBUTION PANEL #2	40 horas	T0+100	Montador 2
289	0973525140800.0(	CB DISTRIBUTION PANEL #3	40 horas	T0+107	Montador 2
290	**0973524201000**	**CABLE SET PD#3**	**15 días**		
291	0973545047100	W471 - FIRE IN	10 horas	T0+96	Montador 3
292	0973545047200	W472 - DBCU	10 horas	T0+97	Montador 3
293	0973545047300	W473 - EMERGENCY	10 horas	T0+98	Montador 3
294	0973545047400	W474 - EM PWR RACK	10 horas	T0+99	Montador 3
295	0973545047500	W475 - AIR FLOW/DB	10 horas	T0+103	Montador 3
296	0973545047600	W476 - SEATS	10 horas	T0+104	Montador 3
297	0973545047800	W478 - FIRE OUT	10 horas	T0+106	Montador 3
298	0973545048000	W480 - CLS STOP	10 horas	T0+105	Montador 3
299	0973545048100	W481 - OBSERVER	10 horas	T0+110	Montador 3

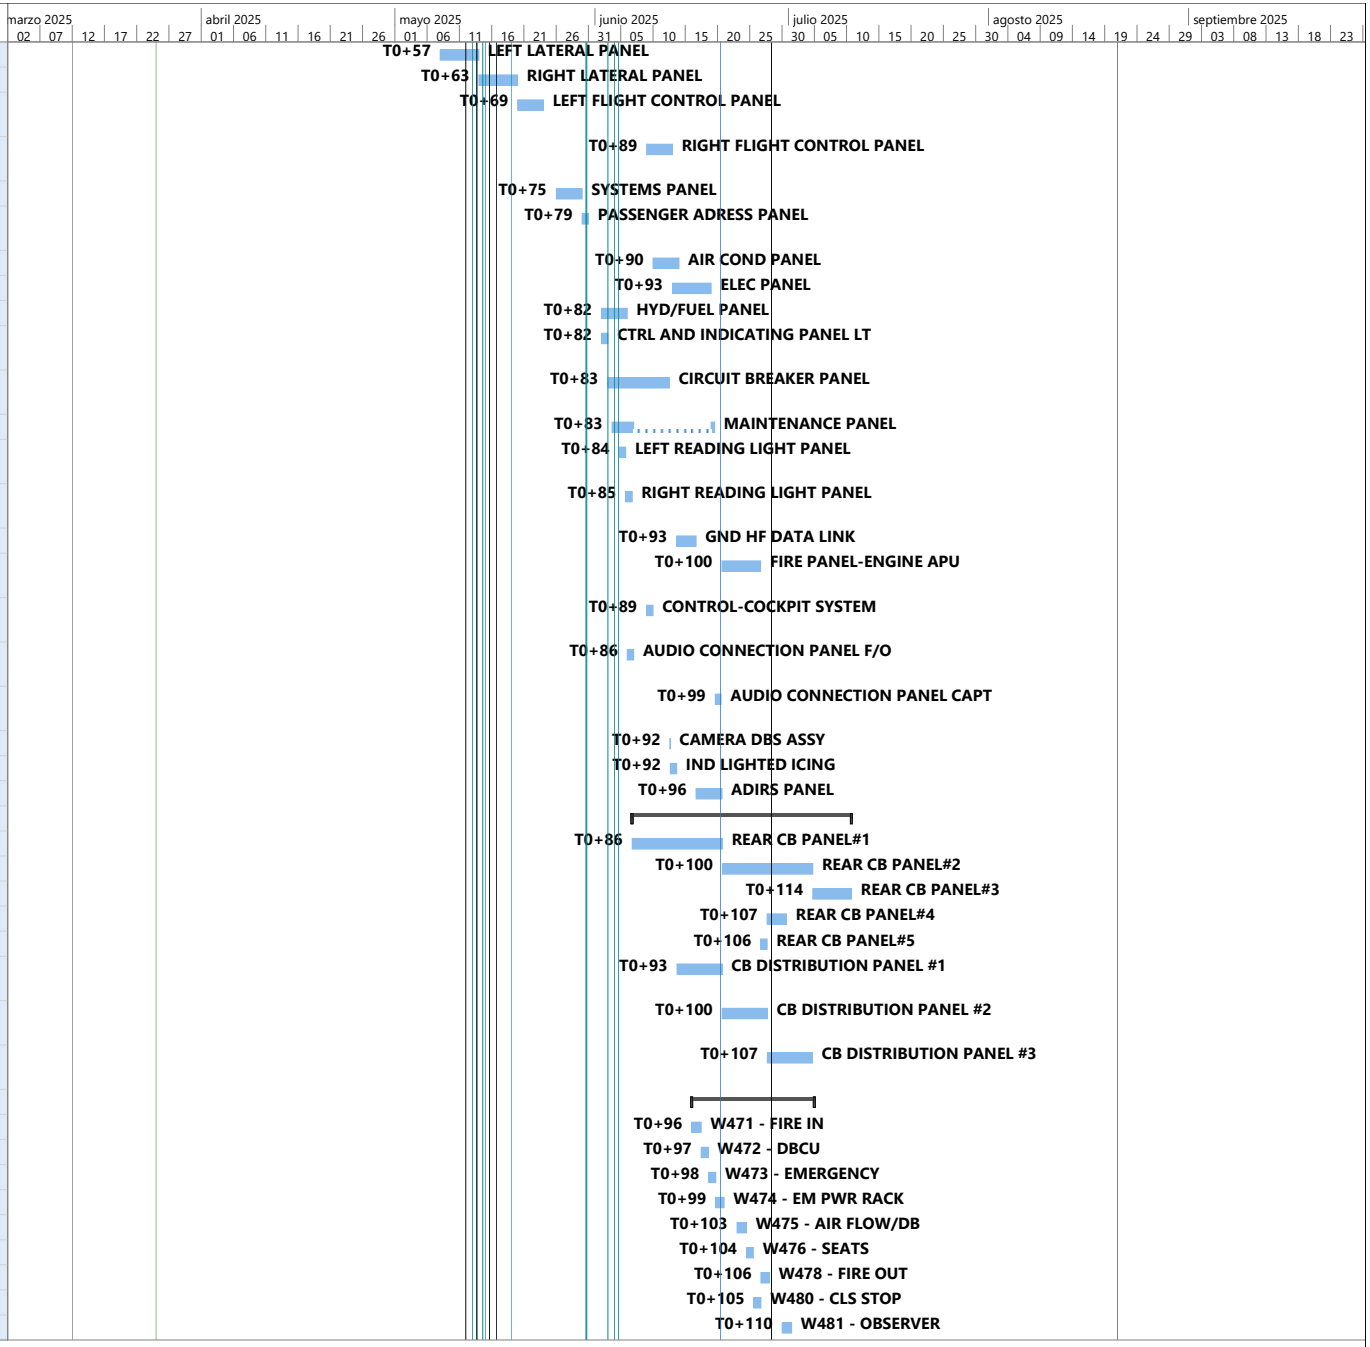

Id	Código INDRA	Nombre de tarea	Duración	Fecha relativa (en días)	Nombres de los recursos
300	0973545048200	W482 - IOS#1	10 horas	T0+111	Montador 3
301	0973545048700	W487 - 400 HZ	10 horas	T0+112	Montador 3
302	0973545048800	W488 - 400 HZ	10 horas	T0+113	Montador 3
303	**0973524200600**	**CABLE SET RJ45 EEQ#2**	**4,79 días**		
304	0973524200600	CABLE SET RJ45 EEQ#2	1 día	T0+110	Montador 4
305	0973544200622	KVM AVICOM	0 horas	T0+114	
306	0973544200625	KVM CLS	0 horas	T0+117	
307	0973544200623	KVM EGPWS	0 horas	T0+114	
308	0973544200624	KVM RTIO	0 horas	T0+111	
309	0973544200606	LAN AVICOM MNT	0 horas	T0+114	
310	0973544200601	LAN AVICOM RT	0 horas	T0+114	
311	0973544200609	LAN CLS MNT	0 horas	T0+117	
312	0973544200604	LAN CLS RT	0 horas	T0+117	
313	0973544200611	LAN DBFCAM MNT	0 horas	T0+117	
314	0973544200607	LAN EGPWS MNT	0 horas	T0+114	
315	0973544200602	LAN EGPWS RT	0 horas	T0+114	
316	0973544200605	LAN EQUALIZER RT	0 horas	T0+117	
317	0973544200608	LAN RTIO MNT	0 horas	T0+117	
318	0973544200603	LAN RTIO RT	0 horas	T0+117	
319	0973544200610	LAN TEMP MNT	0 horas	T0+117	
320	0973544200615	RED RTIO #1	0 horas	T0+117	
321	0973544200616	RED RTIO #2	0 horas	T0+117	
322	0973544200617	RED RTIO #3	0 horas	T0+117	
323	0973544200618	RED RTIO #4	0 horas	T0+117	
324	0973544200619	RED RTIO #5	0 horas	T0+117	
325	0973544200620	RED RTIO #6	0 horas	T0+117	
326	0973544200621	RED RTIO COM	0 horas	T0+117	
327	**0973525240000.0(**	**IOS STATION#1**	**4 días**		
328	0973525240200.0(	IOS CONNECTION BO)	1 día	T0+100	Montador 4
329	0973525240300.0(	IOS Emergency Panel	4 horas	T0+103	Montador 4
330	0973525240400.0(	FFIOS Panel	1 día	T0+104	Montador 4
331	0972825240800.0(	Seat Panel	4 horas	T0+105	Montador 4
332	0973525240600.0(	IOS Audio Connection Panel	1 día	T0+105	Montador 4
333	**0973525270800.0(**	**OBSERVER SEAT**	2,25 días		
334	0973525270900.0(	Audio and Seat Panel	1 día	T0+106	Montador 4
335	0972825271100.0(	AFTOUT EMO	2 horas	T0+107	Montador 4
336	0972825271200.0(	CTRL& EM PANEL	4 horas	T0+107	Montador 4
337	0972825272800.0(	FIRE ALARM PANEL	4 horas	T0+110	Montador 4
338		**Instalación**	**43,38 días**		
339	0973524430100	CABLE SET GROUND	20 horas	T0+61	Instalador 1
340	0973525190000.0(	ELECTRONIC EQUIP #1	14 horas	T0+61	Instalador 2
341	0973525200000.0(	ELECTRONIC EQUIP #2	14 horas	T0+62	Instalador 2
342	0973525210000.0(	ELECTRONIC EQUIP #3	10 horas	T0+64	Instalador 2
343	0973525220000.0(	ELECTRONIC EQUIP #4	10 horas	T0+65	Instalador 2
344	0973525300500.0(	BASEFRAME POWER STRIPS	4 horas	T0+63	Instalador 1
345	0973525300000.0(	BASEFRAME	16 horas	T0+64	Instalador 1
346	0973524430000	CABLE SET POWER RACK	32 horas	T0+68	Instalador 1
347	0973524190000	CABLE SET EEQ#1	12 horas	T0+69	Instalador 2
348	0973524200000	CABLE SET EEQ#2	12 horas	T0+70	Instalador 2
349	0973524191400.0(	CABLE SET PD#1	12 horas	T0+72	Instalador 2
350	0973524191500	CABLE SET PD#2	12 horas	T0+75	Instalador 2

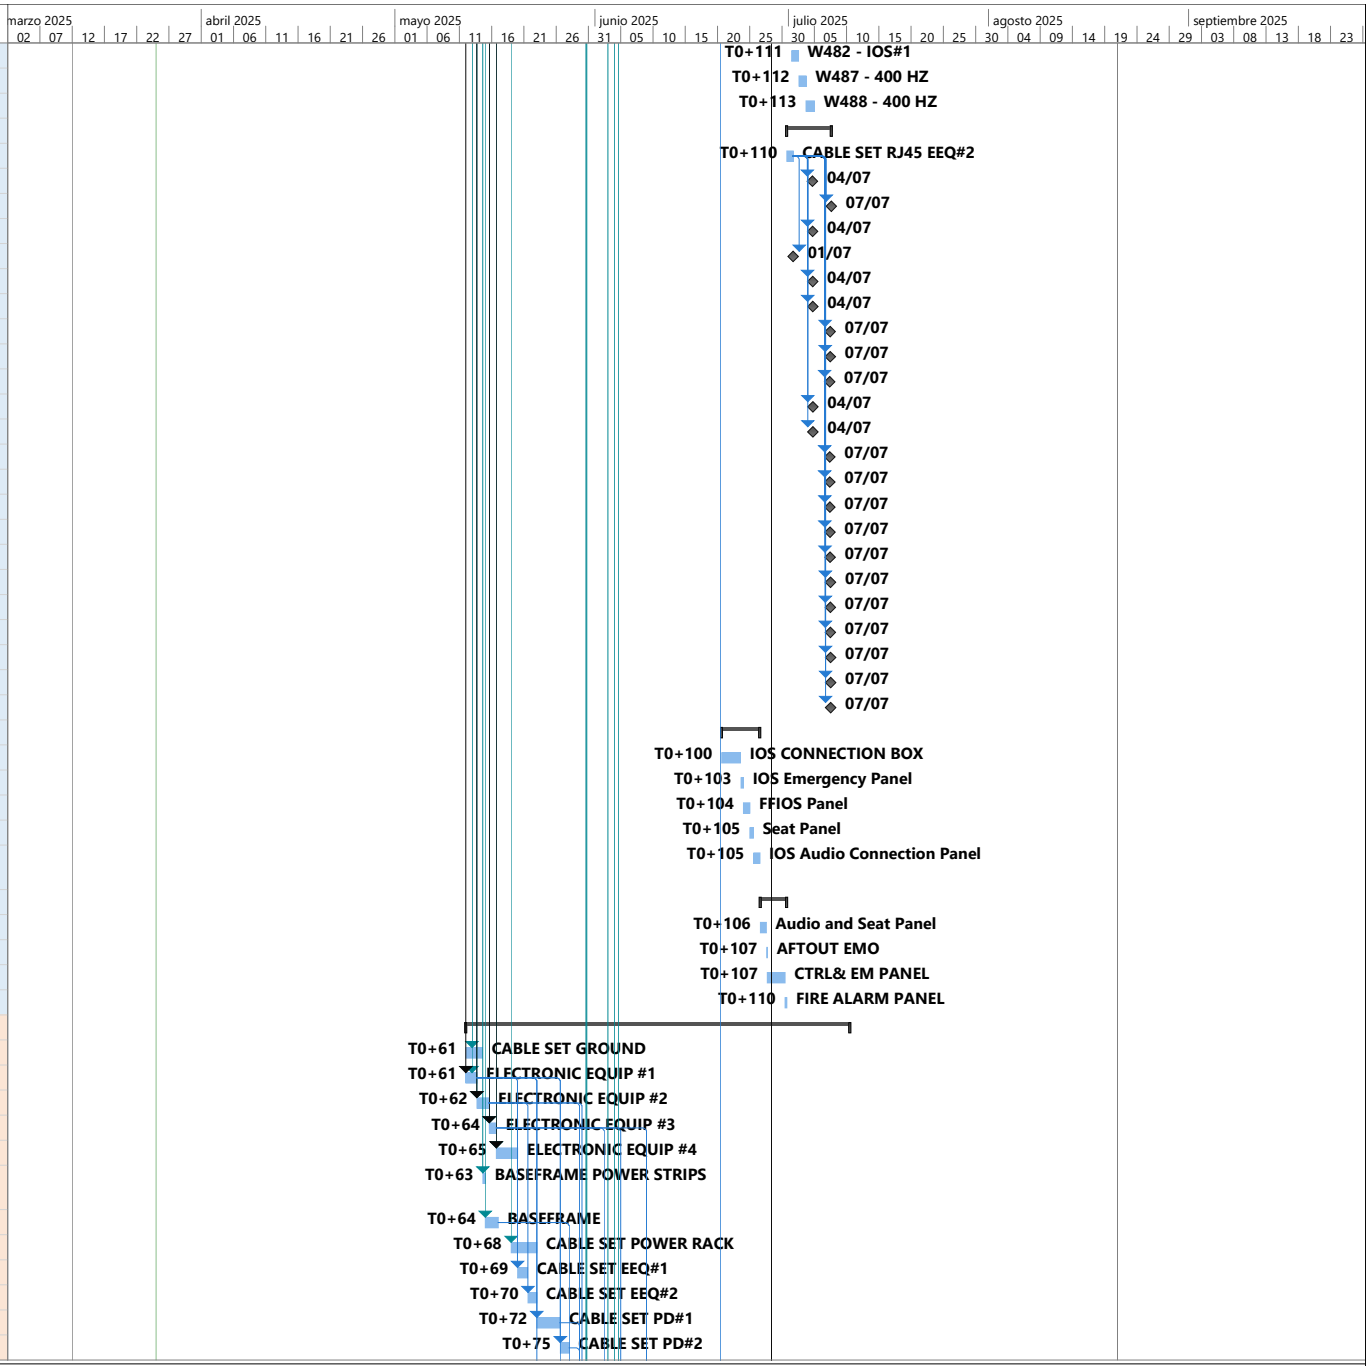

Id	Código INDRA	Nombre de tarea	Duración	Fecha relativa (en días)	Nombres de los recursos
351	0973524190300.0(	CABLE SET OVHDP	12 horas	T0+72	Instalador 1
352	0973524190100	CABLE SET POWER EEQ#1 (CABLE SET RTIO)	12 horas	T0+75	Instalador 1
353	0973524300100.0(	CABLE SET MIP	12 horas	T0+77	Instalador 2
354	0973524300000	CABLE SET BASEFRAME	12 horas	T0+77	Instalador 1
355	0973524020000.0(	CABLE SET CAN	32 horas	T0+78	Instalador 2
356	0973524201800.0(	CABLE SET AVICOM	4 horas	T0+78	Instalador 1
357	0973524201600	CABLE SET AVDP	4 horas	T0+79	Instalador 1
358	0973524070200	CABLE SET ETH DISPLAY UNITS	3 horas	T0+79	Instalador 1
359	0973524070300	CABLE SET PWR DISPLAY UNITS	3 horas	T0+79	Instalador 1
360	0973524212100	CABLE SET COMMS DP	6 horas	T0+82	Instalador 1
361	0973525020000.0(	FLIGHT COMPARTMENT	1 día	T0+83	Instalador 1
362	0973525170000.0(	COCKPIT FRAME	8 horas	T0+84	Instalador 1
363	0973525170100.0(	CLS	12 horas	T0+84	Instalador 2
364	0973525411000	CABLE SET DACS	16 horas	T0+85	Instalador 1
365	0973524210200	CABLE SET DACS EEQ#3	8 horas	T0+89	Instalador 1
366	0973525320000.0(	MOTION SYSTEM	20 horas	T0+90	Instalador 1;I
367		CARENADOS	20 horas	T0+92	Instalador 1;I
368	0973525310000.0(	DRAWBRIDGE	20 horas	T0+97	Instalador 1;I
369	0973525400000.0(	AIR CONDITIONING SYSTEM	3 días	T0+99	
370		**Paneles Cabina**	**5,63 días**		
371	0973525030000.0(	LEFT CONSOLE	3 horas	T0+99	Instalador 2
372	0973525040000.0(	LEFT INSTRUMENT PANEL	1 hora	T0+99	Instalador 2
373	0973525050000.0(	RIGHT INSTRUMENT PANEL	1 hora	T0+100	Instalador 2
374	0973525060000.0(	RIGHT CONSOLE	4 horas	T0+100	Instalador 2
375	0973525090000.0(	PEDESTAL	4 horas	T0+100	Instalador 2
376	0973525070000.0(	MAIN INSTRUMENT PANEL	4 horas	T0+103	Instalador 2
377	0973525100000.0(	GLARESHIELD	4 horas	T0+103	Instalador 2
378	0973525110000.0(	OVERHEAD PANEL	4 horas	T0+104	Instalador 2
379	0973525135000.0(	C/B CABIN PANEL	4 horas	T0+104	Instalador 2
380	0973525150000.0(	MISCELLANEOUS LIGHTING	8 horas	T0+105	Instalador 2
381	0973525160000.0(	MISCELLANEOUS EQUIPMENT	8 horas	T0+106	Instalador 2
382	0973524201000	CABLE SET PD#3	20 horas	T0+99	Instalador 1
383	0973524310000	CABLE SET DRAWBRIDGE	8 horas	T0+104	Instalador 1
384	0973525330000.0(	PROCESSOR RACK #1	100 horas	T0+71	Instalador 3
385	0973524070100	CABLE SET VIDEO DISPLAY UNITS	3 horas	T0+105	Instalador 1
386	0973524200600	CABLE SET RJ45 EEQ#2	12 horas	T0+105	Instalador 1
387	0973524000100	CABLE SET LAN INTERCONNECTION	12 horas	T0+106	Instalador 1
388	0973525420000.0(	FIRE DETECTION	40 horas	T0+107	Instalador 2
389	0973524420000	CABLE SET FIRE DETECTION	8 horas	T0+114	Instalador 2
390	0973525410000.0(	SMOKE GENERATION	40 horas	T0+110	Instalador 1
391	0973524410000	CABLE SET SMOKE	8 horas	T0+117	Instalador 1
392	0973525240000.0(	IOS STATION#1	8 horas	T0+118	Instalador 1
393	0973525270800.0(	OBSERVER SEAT	8 horas	T0+119	Instalador 1
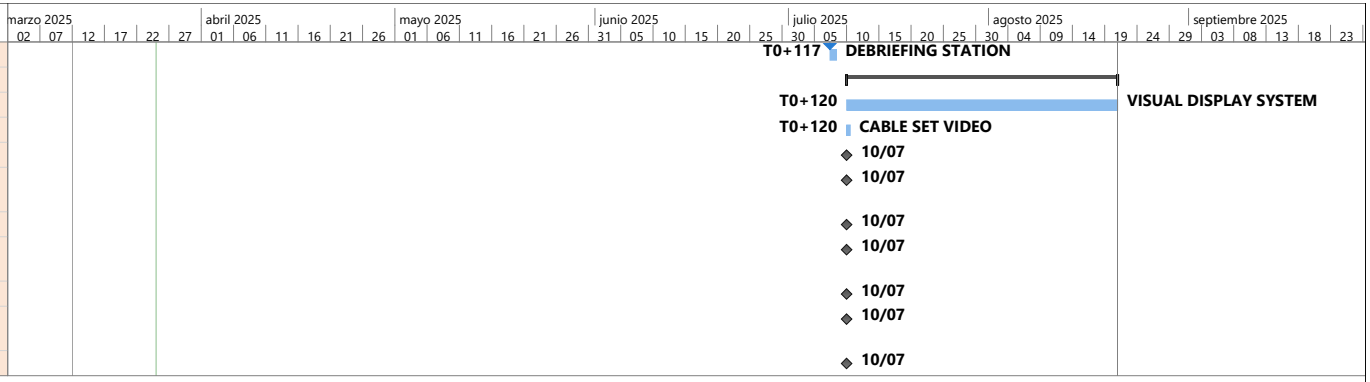
Id	Código INDRA	Nombre de tarea	Duración	Fecha relativa (en días)	Nombres de los recursos
394	0973525480000.0(	DEBRIEFING STATION	8 horas	T0+117	Instalador 2
395		**Sistema Visual**	**30 días**		
396	0973525290000.0(	VISUAL DISPLAY SYSTEM	30 días	T0+120	
397	0973524017000	CABLE SET VIDEO	4 horas	T0+120	
398	0973524290000	CABLE SET DISPLAY	0 días	T0+120	
399	0973523060000.0(	CABLE SET DISPLAY PROJECTION	0 días	T0+120	
400	0973523062000.0(	CABLE SET DISPLAY LAN	0 días	T0+120	
401	0973523064000.0(	CABLE SET OPTICAL BLENDING	0 días	T0+120	
402	0973523066000.0(	CABLE SET VACCUM	0 días	T0+120	
403	0973523067000.0(	CABLE SET DISPLAY POWER	0 días	T0+120	
404	0973523068700	CABLE SET RELAY CARD	0 días	T0+120
